




# МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА Инфекционного центра в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)

30 марта 2020


## Схема расположения объекта мониторинга

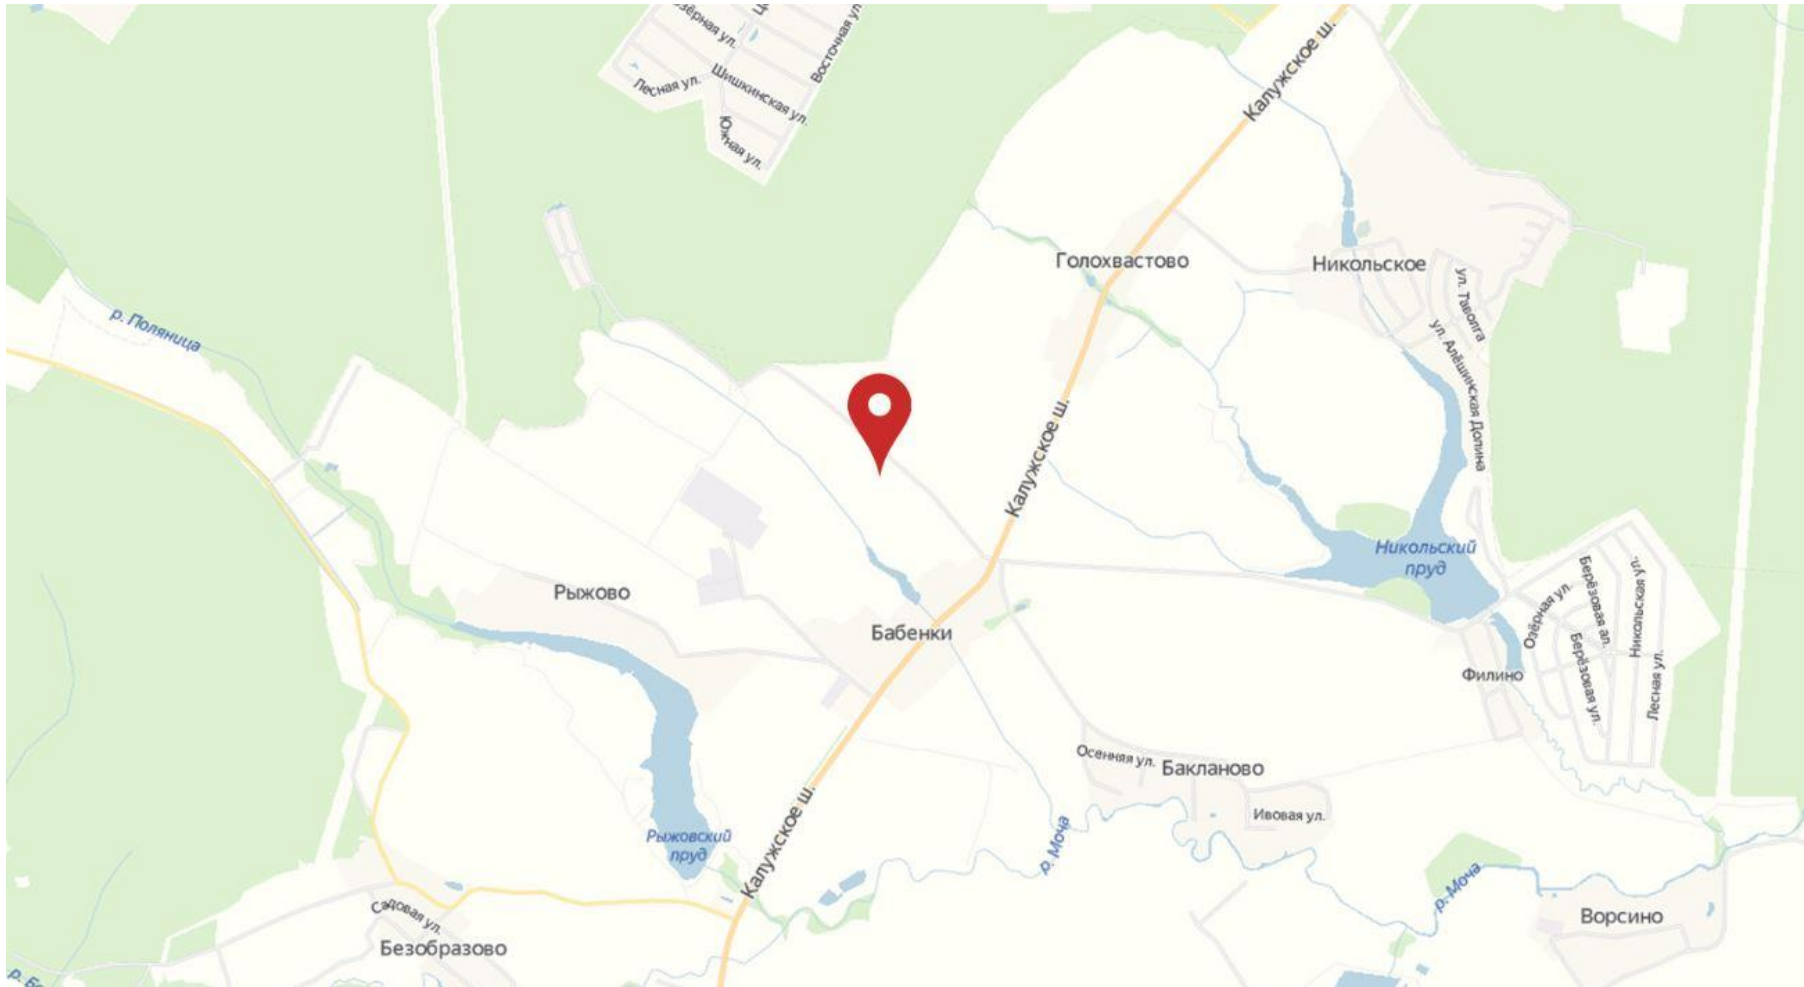

Объект мониторинга: Инфекционный центр в ТиНАО

Адрес: поселение Вороновское, в районе деревни Голохвастово

# Инфекционная больница (Голохвастово)

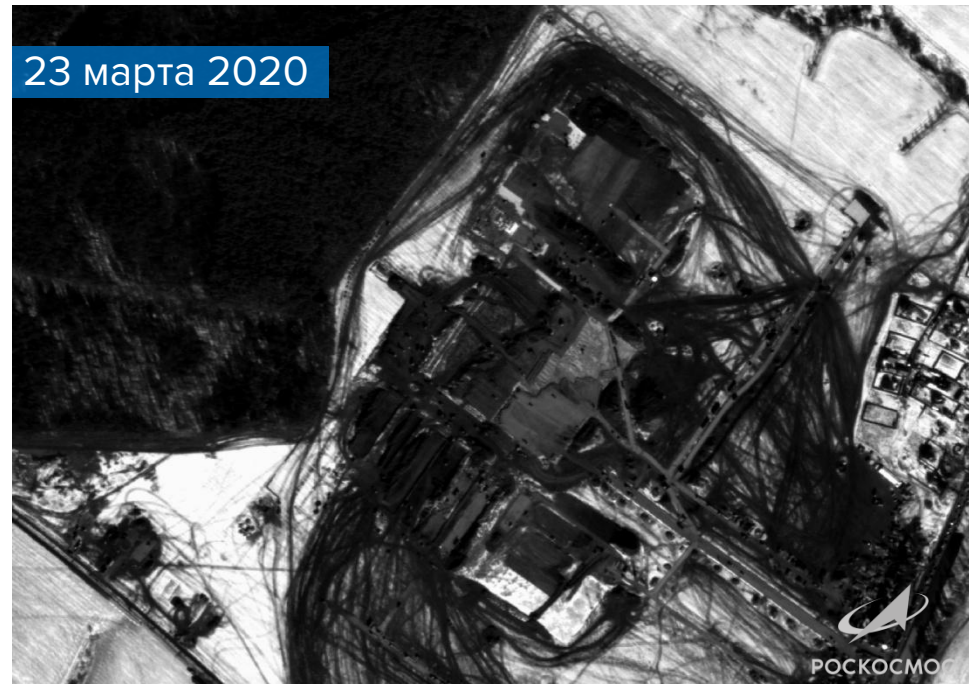

Строительство началось 12 марта 2020 года.

На 23 марта 2020 года выполняются подготовительные работы строительной площадки:

- ✓ Ограждение участка
- ✓ Строительство временной инфраструктуры: дорог, прокладка инженерных сетей
- ✓ Сооружение временных административных и бытовых помещений



# Инфекционная больница (Голохвастово)

Текущее положение дел

28 марта 2020



● Блок А (Лечебный блок):  
A1...A7 – Лечебные блоки  
A8 – Патологоанатомический блок  
A9 – Блок по обеззараживанию отходов  
A10 – Лабораторный блок  
A11 – Хозяйственный блок  
A12 – Блок мойки и санобработки

● Блок Б (Блок реанимации):  
B1...B8, B10 – Блоки реанимации  
B9 – Операционный блок  
B9a – Диагностический блок  
B11 – Приемный блок  
B12 – Блок выписки здоровых пациентов  
B13 – Прачечная и помещение для хранения личных вещей  
B14 – Центр стерилизации оборудования  
B15 – Санпропускник  
B16 – Блок мойки автотранспорта

● Блок В (Служебный блок):  
V1...V12, V18 – Блоки общежитий  
V13 – Блок администрации  
V14, V17 – Склад инвентаря  
V15 – Склад медикаментов  
V16 – Пищеблок  
V19 – Диспетчерская



# Блок А (Лечебный блок)

## Текущее положение дел

28 марта 2020



Блок А:

Лечебные блоки А1...А4 – выполнено возведение каркаса здания на 75%.

Лечебные блоки А5...А7 – работы по возведению каркаса здания выполнены на 65%.

Блок А8 (Патологоанатомический блок) – кровельные работы выполнены на 85%.

Блок А9 (Блок по обеззараживанию отходов) – кровельные работы выполнены на 50%.

Блок А10 (Лабораторный блок) – установлен каркас здания, приступили к кровельным работам.

Блок А11, А12 – выполняются работы по возведению каркаса 1-го этажа.



# Блок Б (Блок реанимации)

## Текущее положение дел

28 марта 2020



Блок Б:

Блок Б1 – возведение каркаса здания на 25%.

Блок Б2 – установка армированного фундамента выполнена на 90%.

Блок Б3, Б4, Б8 – кровельные работы выполнены на 100%.

Блок Б5 – установка армированного фундамента выполнена на 85%.

Блок Б6, Б7 – кровельные работы выполнены на 70%.

Блок Б9а и блок Б9 – работы не начаты.

Блок Б10 – ведутся железобетонные работы по установке фундаментных блоков.

Блок Б11 (Приемный блок) – ведутся бетонные работы по устройству фундамента.

Блок Б12, Б13, Б14, Б15, Б16 – приступили к возведению крыши.



# Блок В (Блок реанимации)

## Текущее положение дел

28 марта 2020



Блок В:

Блок В1...В12, В18 (Служебные блоки) – ведутся бетонные работы: возведение и гидроизоляция фундамента.

Блок В13 (блок администрации) – кровельные работы выполнены на 100%.


Блоки В14, В17 (Склад инвентаря) – кровельные работы выполнены на 85%.

Блок 15 (Склад медикаментов) – кровельные работы завершены.

Блок 16 (Пищеблок) – кровельные работы завершены.

# Количество работающей строительной техники

## Количество работающей строительной техники

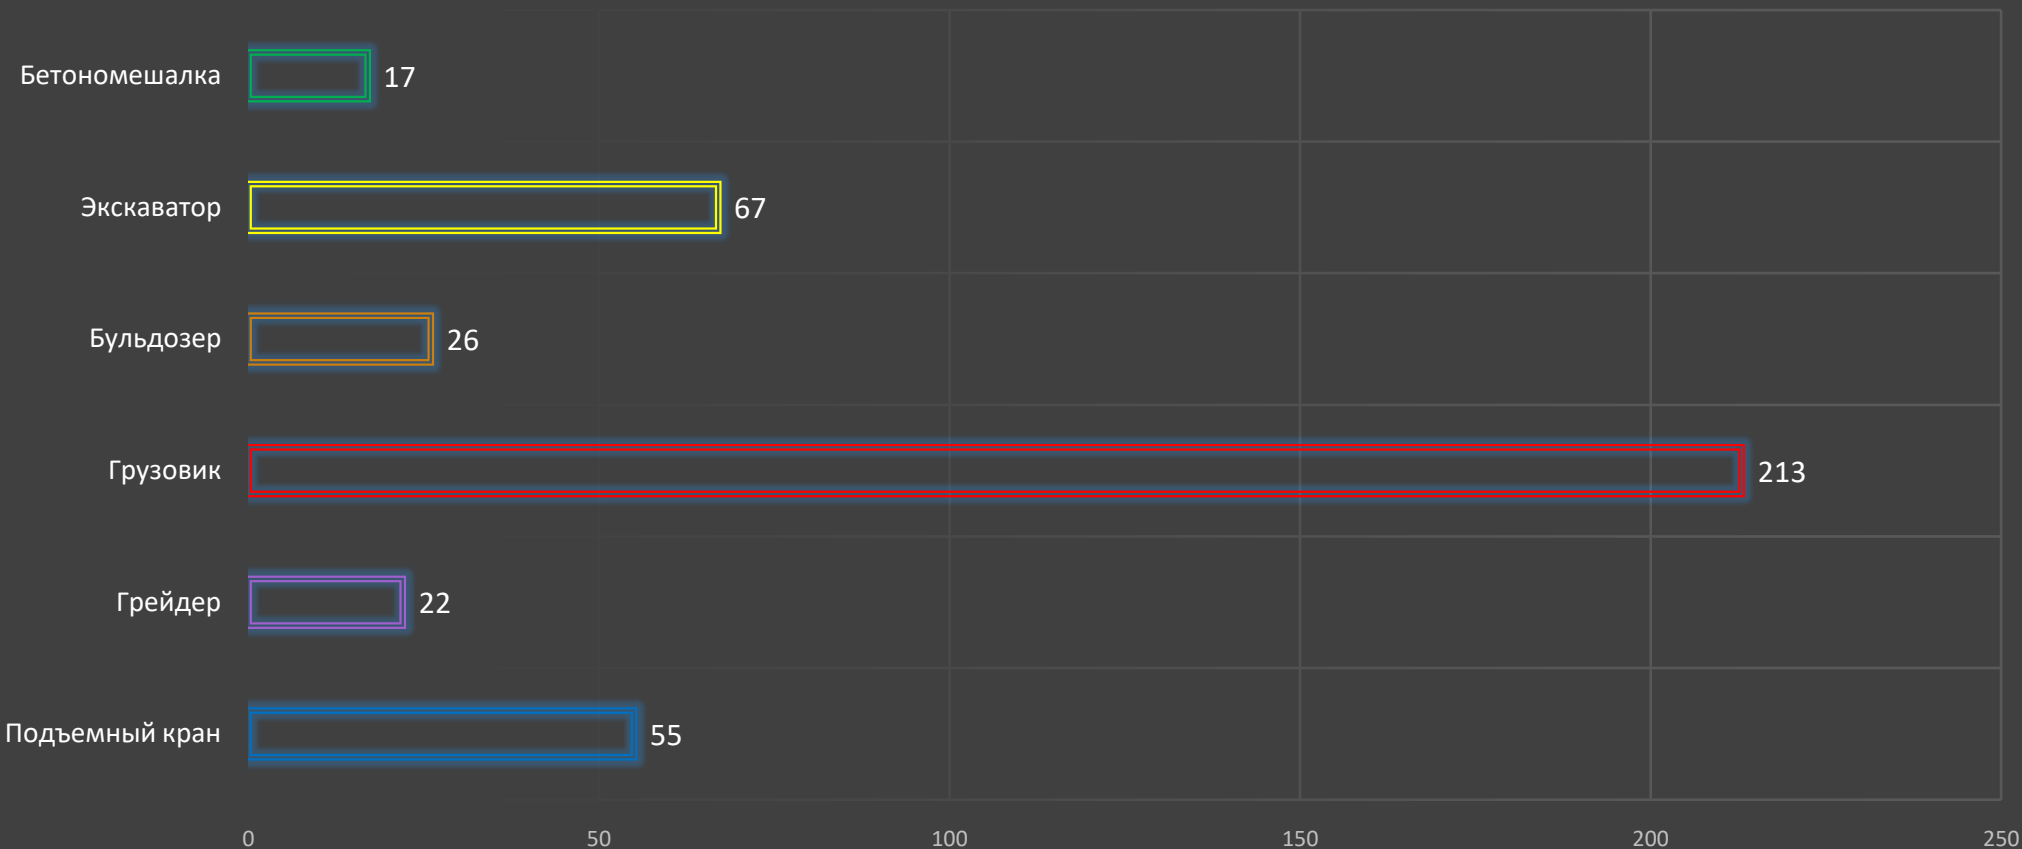

Дата мониторинга: 28.03.2020 г.
