

ДВАЖДЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА  
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО № 1

Ваш № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 196 г. № 10828 от 31 1966 г.

В дело 24  
применение  
тов. Тюмину  
отправить  
Г. А.  
Тюмин  
3.XI.66г.

В дело 24  
Димин  
15.II.67г.

Секретно  
ЭКЗ. № 1

НАЧАЛЬНИКУ 3-го ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МОМ

ТОВ. КЕРИМОВУ К.А. РАССЕКРЕЧЕНО

Акт № 001-9  
от 27.12.2017г. Куз

В соответствии с Вашим указанием направляю Вам укрупненный сетевой график подготовки космического корабля ЗКВ № 6.

Имея в виду чрезвычайную загруженность объекта 353 в в/ч II284 графиком предусмотрены подготовка и проведение работ с космическим кораблем ЗКВ № 6 с объекта I35.

В связи с этим, необходимо полностью демонтировать наземное испытательное оборудование и кабельную сеть с пл.3I и перебросить ее на пл.2, при этом, потребуется, из-за отличия в планировках объектов 353 и I35, изготовление большого количества наземных кабелей.

На пл.2 все наземное испытательное оборудование должно быть развернуто, испытано и подготовлено к испытаниям.

Подготовка космического корабля ЗКВ № 6 отвлечет большое количество основных специалистов ОКБ-I, смежных организаций и испытателей в/ч II284 от работ с объектами IIФ6I5, IIC824.

Исходя из основных причин, указанных выше, считаем целесообразным не производить подготовку космического корабля ЗКВ № 6 к пуску в этом году.

Приложение: "Укрупненный сетевой график подготовки космического корабля ЗКВ № 6", п.у.с/I7I2, секретно, на I-м листе, только в адрес.

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР


(МИШИН)

г. Минин  
29 X 66



УТВЕРЖДАЮ  
Главный конструктор ОКБ-1  
Мишин

# Сетевой график работ с космическим кораблем ЗКВ №6 / укрупненный /

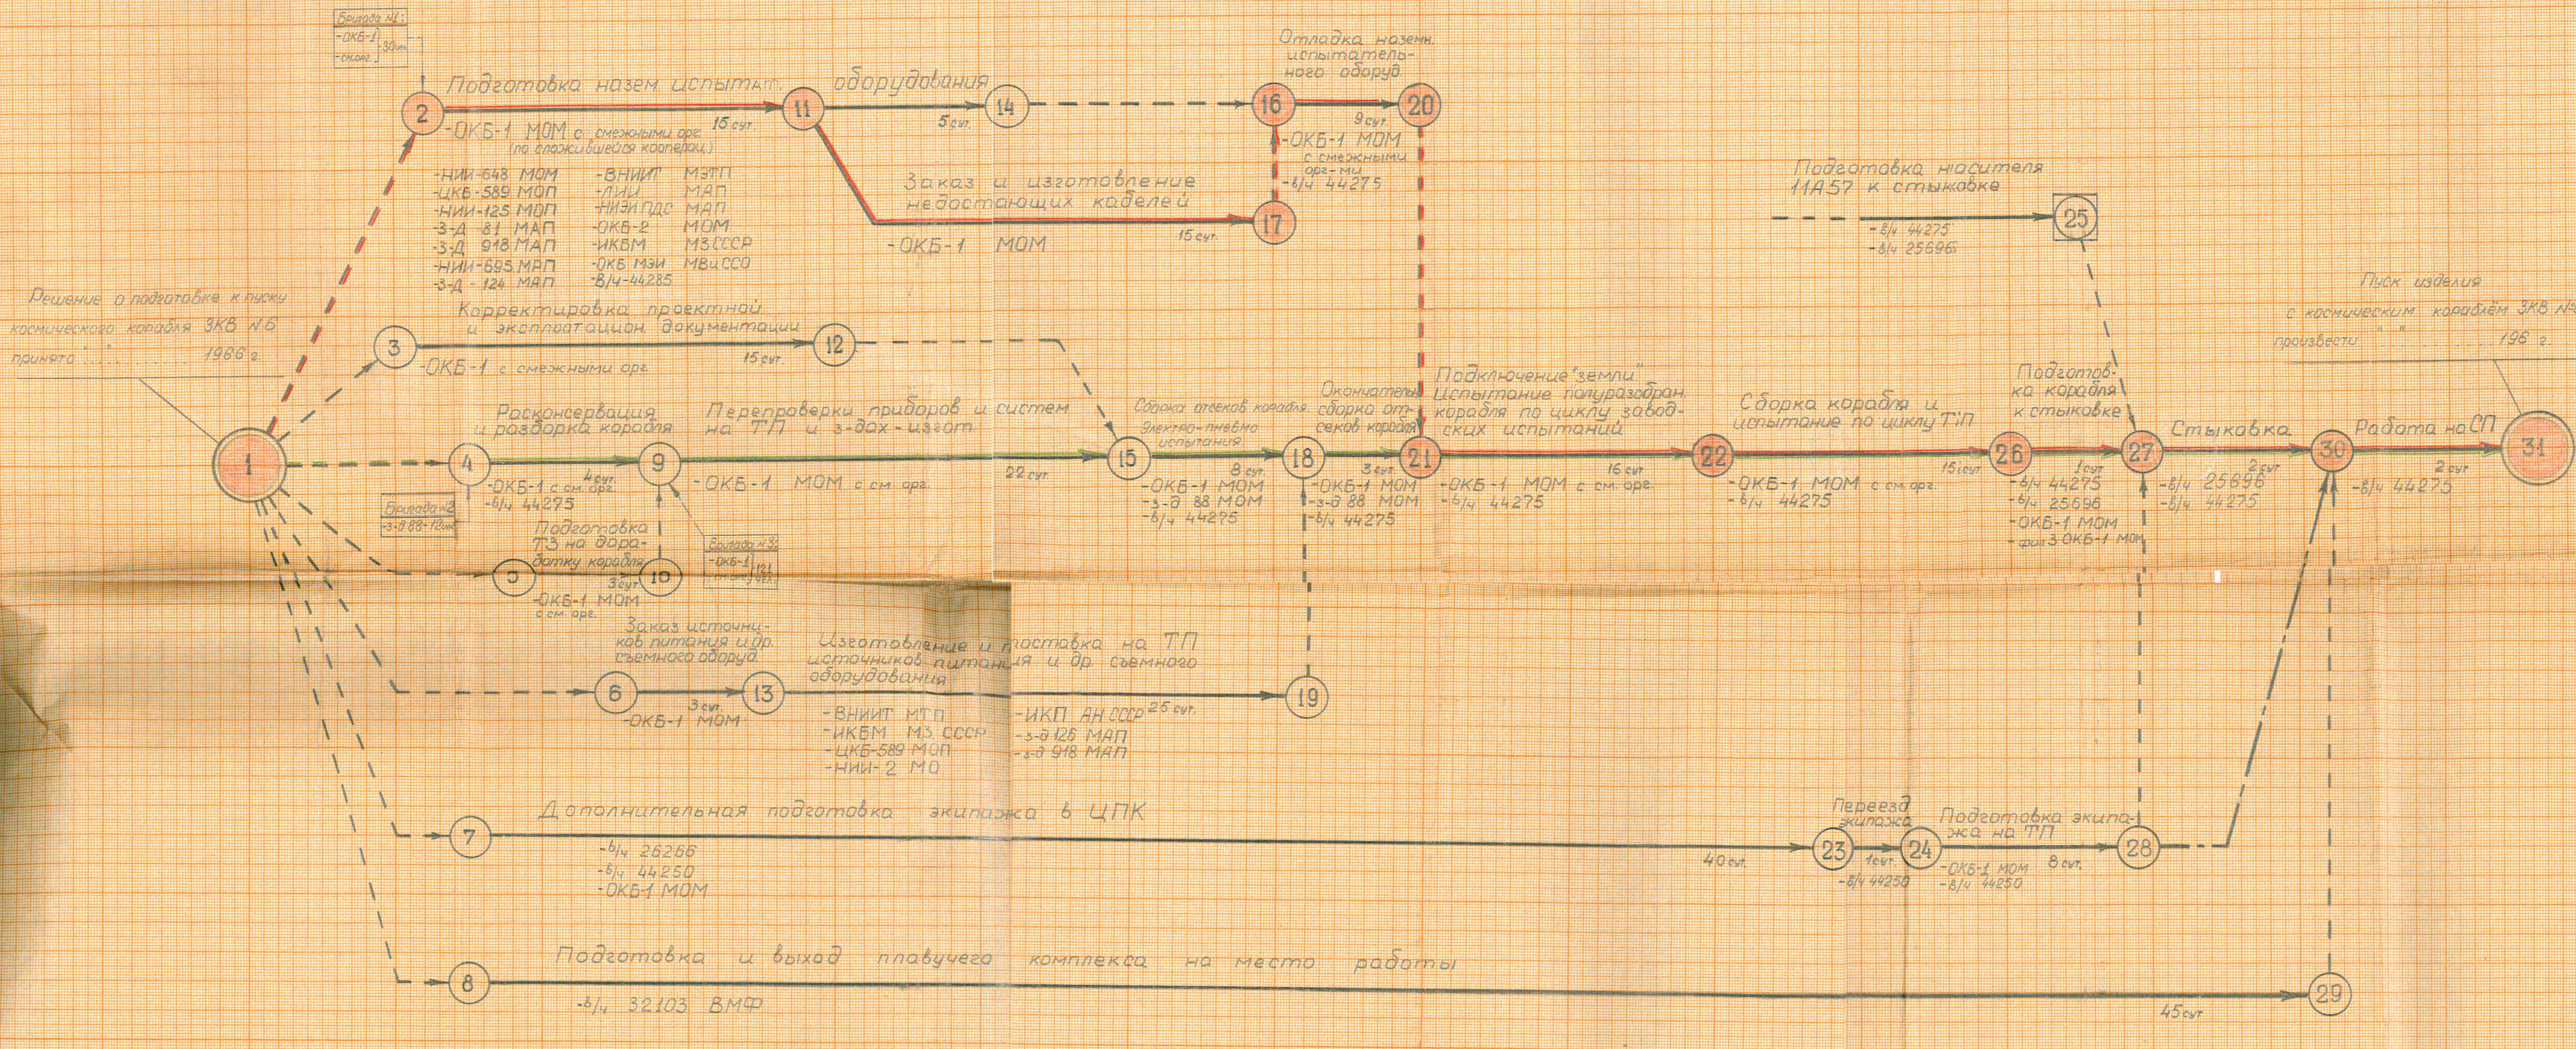

- 31 Работы на СП по 1-му и 2-му стартовым дням за-  
кончены; пуск изделия с космич. корабл. ЗКВ №6 произведен
- 30 Стыковка корабля с носителем закончена. Изделие  
подготовлено к выводу на СП.
- 29 Плавучий комплекс прибыл на место работы и за-  
кончил подготовку к пуску космич. корабля ЗКВ №6.
- 28 Тренировки экипажа на ТП закончены. Экипаж  
к полету готов.
- 27 Корабль подготовлен к стыковке с носителем.
- 26 Сборка и испытания корабля по циклу ТП закончены.
- 25 Носителя ИА57 подготовлен к стыковке с кораб-  
лем ЗКВ №6.
- 24 Экипаж космического корабля прибыл на ТП.
- 23 Дополнительная подготовка экипажа в ЦПК  
к полету закончена.
- 22 Испытания полуразобранного корабля завершены;  
начаты сборка и испытания корабля по циклу ТП.
- 21 Отсеки корабля окончательно собраны; начаты  
испытания полуразобранного корабля.
- 20 Отладка наземного испытательного оборудования  
закончена; оборудование готово к пуску. 6/ч 44275
- 19 Изготовление батарей и наземных аппаратов систем ко-  
нот, болт, др. съемного оборудования закончено;  
батарей, систем и др. съемного оборудования поставлены на ТП.
- 18 Сборка отсеков корабля для испытаний завершена.
- 17 Недостающие кабели изготовлены.
- 16 Начата отладка наземного испытательного оборудо-  
вания.
- 15 Перепроверки приборов и систем закончены. Отсеки  
корабля подготовлены к сборке.
- 14 Подготовка наземного испыт. оборудования закончена.
- 13 Заказы на изготовление контейнеров бод.  
и пищи и др. выданы. Начата изготовление бод.  
и наземных аппаратов систем "Конотус", "Солнеч" и др.
- 12 Корректировка проектной и эксплуатационной  
документации завершена.
- 11 Заказ на изготовление недостающих кабелей выполнен.
- 10 Техническое задание на доработку корабля утверждено.
- 9 Космический корабль разобран. Начаты перепровер-  
ки приборов и систем на ТП и заводах-изготови-  
телях.
- 8 Дана команда плавучему комплексу выйти на  
место работы.
- 7 Начата дополнительная подготовка экипажа  
космического корабля ЗКВ №6 к полету в ЦПК.
- 6 Начата подготовка заказа на источники пита-  
ния, контейнеры боды и пищи, и др. съемного обо-  
рудования.
- 5 Начата подготовка технического задания на до-  
работку космического корабля.
- 4 Начата консервация и разборка космическо-  
го корабля.
- 3 Начата корректировка проектной и эксплуатаци-  
онной документации для космического корабля ЗКВ №6.
- 2 Начата подготовка на ТП наземного испытатель-  
ного оборудования.
- 1 Решение о подготовке к пуску космического ко-  
рабля ЗКВ №6 принято.

Зам. главного конструктора  
Начальник отд. №721

Содержание события		
№ события	Содержание события	Дата
1	Решение о подготовке к пуску космического ко- рабля ЗКВ №6 принято.	14.12.66
2	Начата подготовка на ТП наземного испытатель- ного оборудования.	15.12.66
3	Начата корректировка проектной и эксплуатаци- онной документации для космического корабля ЗКВ №6.	16.12.66
4	Начата консервация и разборка космическо- го корабля.	17.12.66
5	Начата подготовка технического задания на до- работку космического корабля.	18.12.66
6	Начата подготовка заказа на источники пита- ния, контейнеры боды и пищи, и др. съемного обо- рудования.	19.12.66
7	Начата дополнительная подготовка экипажа космического корабля ЗКВ №6 к полету в ЦПК.	20.12.66
8	Дана команда плавучему комплексу выйти на место работы.	21.12.66
9	Космический корабль разобран. Начаты перепровер- ки приборов и систем на ТП и заводах-изготови- телях.	22.12.66
10	Техническое задание на доработку корабля утверждено.	23.12.66
11	Заказ на изготовление недостающих кабелей выполнен.	24.12.66
12	Корректировка проектной и эксплуатационной документации завершена.	25.12.66
13	Заказы на изготовление контейнеров боды и пищи и др. выданы. Начата изготовление боды и наземных аппаратов систем "Конотус", "Солнеч" и др.	26.12.66
14	Подготовка наземного испыт. оборудования закончена.	27.12.66
15	Перепроверки приборов и систем закончены. Отсеки корабля подготовлены к сборке.	28.12.66
16	Начата отладка наземного испытательного оборудо- вания.	29.12.66
17	Недостающие кабели изготовлены.	30.12.66
18	Сборка отсеков корабля для испытаний завершена.	31.12.66
19	Изготовление батарей и наземных аппаратов систем ко- нот, болт, др. съемного оборудования закончено; батарей, систем и др. съемного оборудования поставлены на ТП.	01.01.67
20	Отладка наземного испытательного оборудования закончена; оборудование готово к пуску. 6/ч 44275	02.01.67
21	Отсеки корабля окончательно собраны; начаты испытания полуразобранного корабля.	03.01.67
22	Испытания полуразобранного корабля завершены; начаты сборка и испытания корабля по циклу ТП.	04.01.67
23	Дополнительная подготовка экипажа в ЦПК к полету закончена.	05.01.67
24	Экипаж космического корабля прибыл на ТП.	06.01.67
25	Носителя ИА57 подготовлен к стыковке с кораб- лем ЗКВ №6.	07.01.67
26	Сборка и испытания корабля по циклу ТП закончены.	08.01.67
27	Корабль подготовлен к стыковке с носителем.	09.01.67
28	Тренировки экипажа на ТП закончены. Экипаж к полету готов.	10.01.67
29	Плавучий комплекс прибыл на место работы и за- кончил подготовку к пуску космич. корабля ЗКВ №6.	11.01.67
30	Стыковка корабля с носителем закончена. Изделие подготовлено к выводу на СП.	12.01.67
31	Работы на СП по 1-му и 2-му стартовым дням за- кончены; пуск изделия с космич. корабл. ЗКВ №6 произведен	13.01.67
